АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОЯРСК
КРАЙУГОЛЬ

660075, Россия, Красноярск,
ул. Маерчака, д.34а
Тел. (391) 252-54-42
E-mail: kku@ruscoal.ru
ОКПО 04536157
ОГРН 1022401786373
ИНН/КПП 2460001984/246001001

УТВЕРЖДАЮ
_____ С.Ю. Гиль
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на возведение ангара надувного для обслуживания тепловозов.

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	**Заказчик.**	АО «Красноярсккрайуголь», г. Красноярск, ул. Маерчака 34А
2	**Основание для заключения договора подряда.**	Для повышения КТГ в зимнее время, качественного проведения ТО2, ТО3. Выполнения в летнее и зимнее время ремонт в объеме ТР-1, ТР-2.
3	**Цель выполнения работ.**	Возведение ангара надувного для обслуживания тепловозов АО «Красноярсккрайуголь», для эксплуатации 365 дней в году.
4	**Место выполнения работ.**	Территория угольного разреза «Переясловский» АО «Красноярсккрайуголь» в районе с. Переясловка, Рыбинского района.
5	**Сроки выполнения работ**	Произвести установку ангара за период не более 60 (шестидесяти) календарных дней, после подписания договора.
6	**Условия эксплуатации**	Ангар надувной будет эксплуатироваться при температуре воздуха от -50°С до +50°С в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.
7	**Требование к этапам проведения работ.**	Перед началом производства работ, предусмотреть: - проектирование (стадия «Р»); - проектные решения согласовать с заказчиком.
8	**Технические требования Заказчика к Исполнителю.**	Тип конструкции – надувной ангар; Длина х ширина х высота – 42м х 16м х 10м; Ворота – утепленные торцевые (2 шт.) для заезда тепловозов серии ТЭМ-2 в/и и ТЭМ-18 в/и, размер 5000 мм х 6500 мм. (Ш х В); Входная дверь 2 шт., размер 1000 мм х 2000 мм. (Ш х В); Крышевая вытяжная вентиляция – 2 шт.; Цвет с наружной стороны: основной-белый, второстепенные элементы-синий. Возле входа нанести логотипы «Русский Уголь»; Система освещения – светодиодная (СС Т.1-64) – 30 шт.; Система вентиляции – принудительно приточно-вытяжная; Система отопления – электрическая (тепловые пушки закрытого горения 25 кВт) – 6 шт.; Тепловые завесы на воротах – 2 шт.; 12 силовых розеток в 4-х точках; Щит электрораспределительный; Система электроснабжения с АВР и бензиновым генератором;

		Линия электроснабжения СИП 100 м.; Система пожарной сигнализации; Заземление.
9	**Порядок контроля и приёмки работ.**	Одновременно с установкой ангара Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, технические паспорта, руководства по эксплуатации и т.д. **Исполнитель обязан установить ангар по следующему адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, АО «Красноярскккрайуголь» филиал «Переясловский разрез».**
10	**Условия оплаты.**	Оплата производится в течение **90** календарных дней, на основании предоставленных подписанных сторонами актов и счёт-фактуры.
11	**Гарантии качества на результаты работ.**	Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Поставщик.
12	**Дополнительные требования.**	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары и заключением экспертизы промышленной безопасности на товар, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

Заместитель генерального директора по железнодорожному транспорту АО «Красноярскккрайуголь»

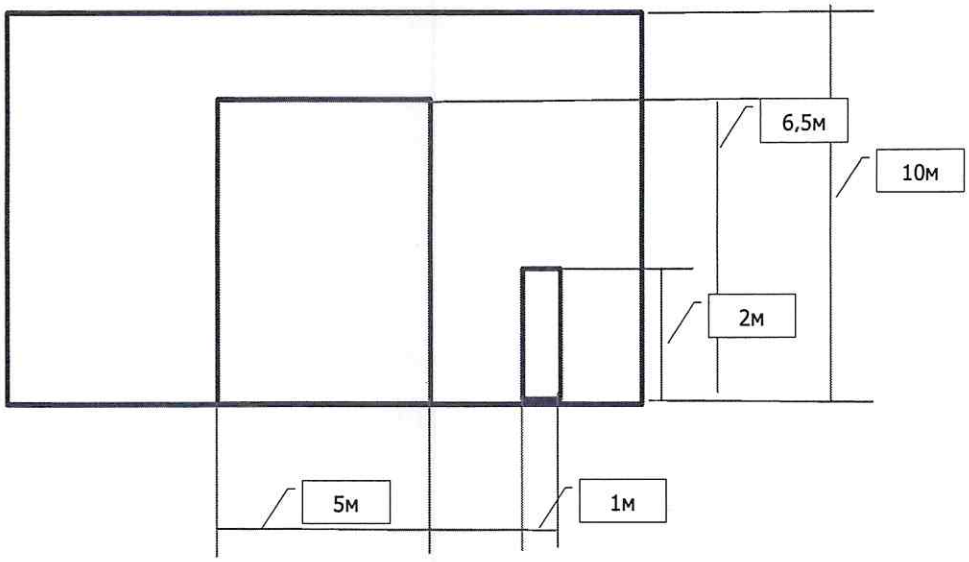
подпись А.Р. Шарофов
инициалы, фамилия

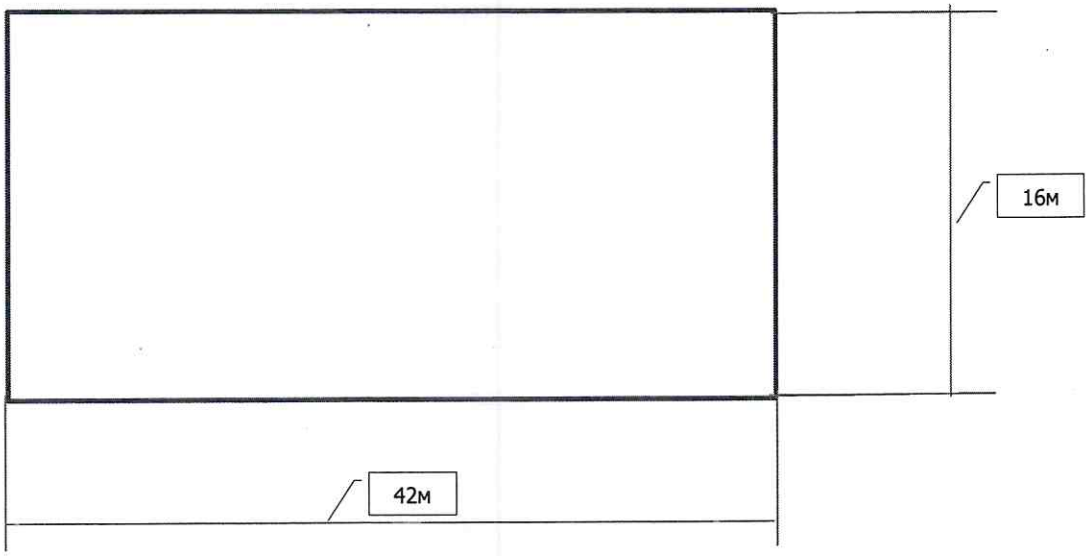
Директор департамента капитального Строительства АО «Русский Уголь»

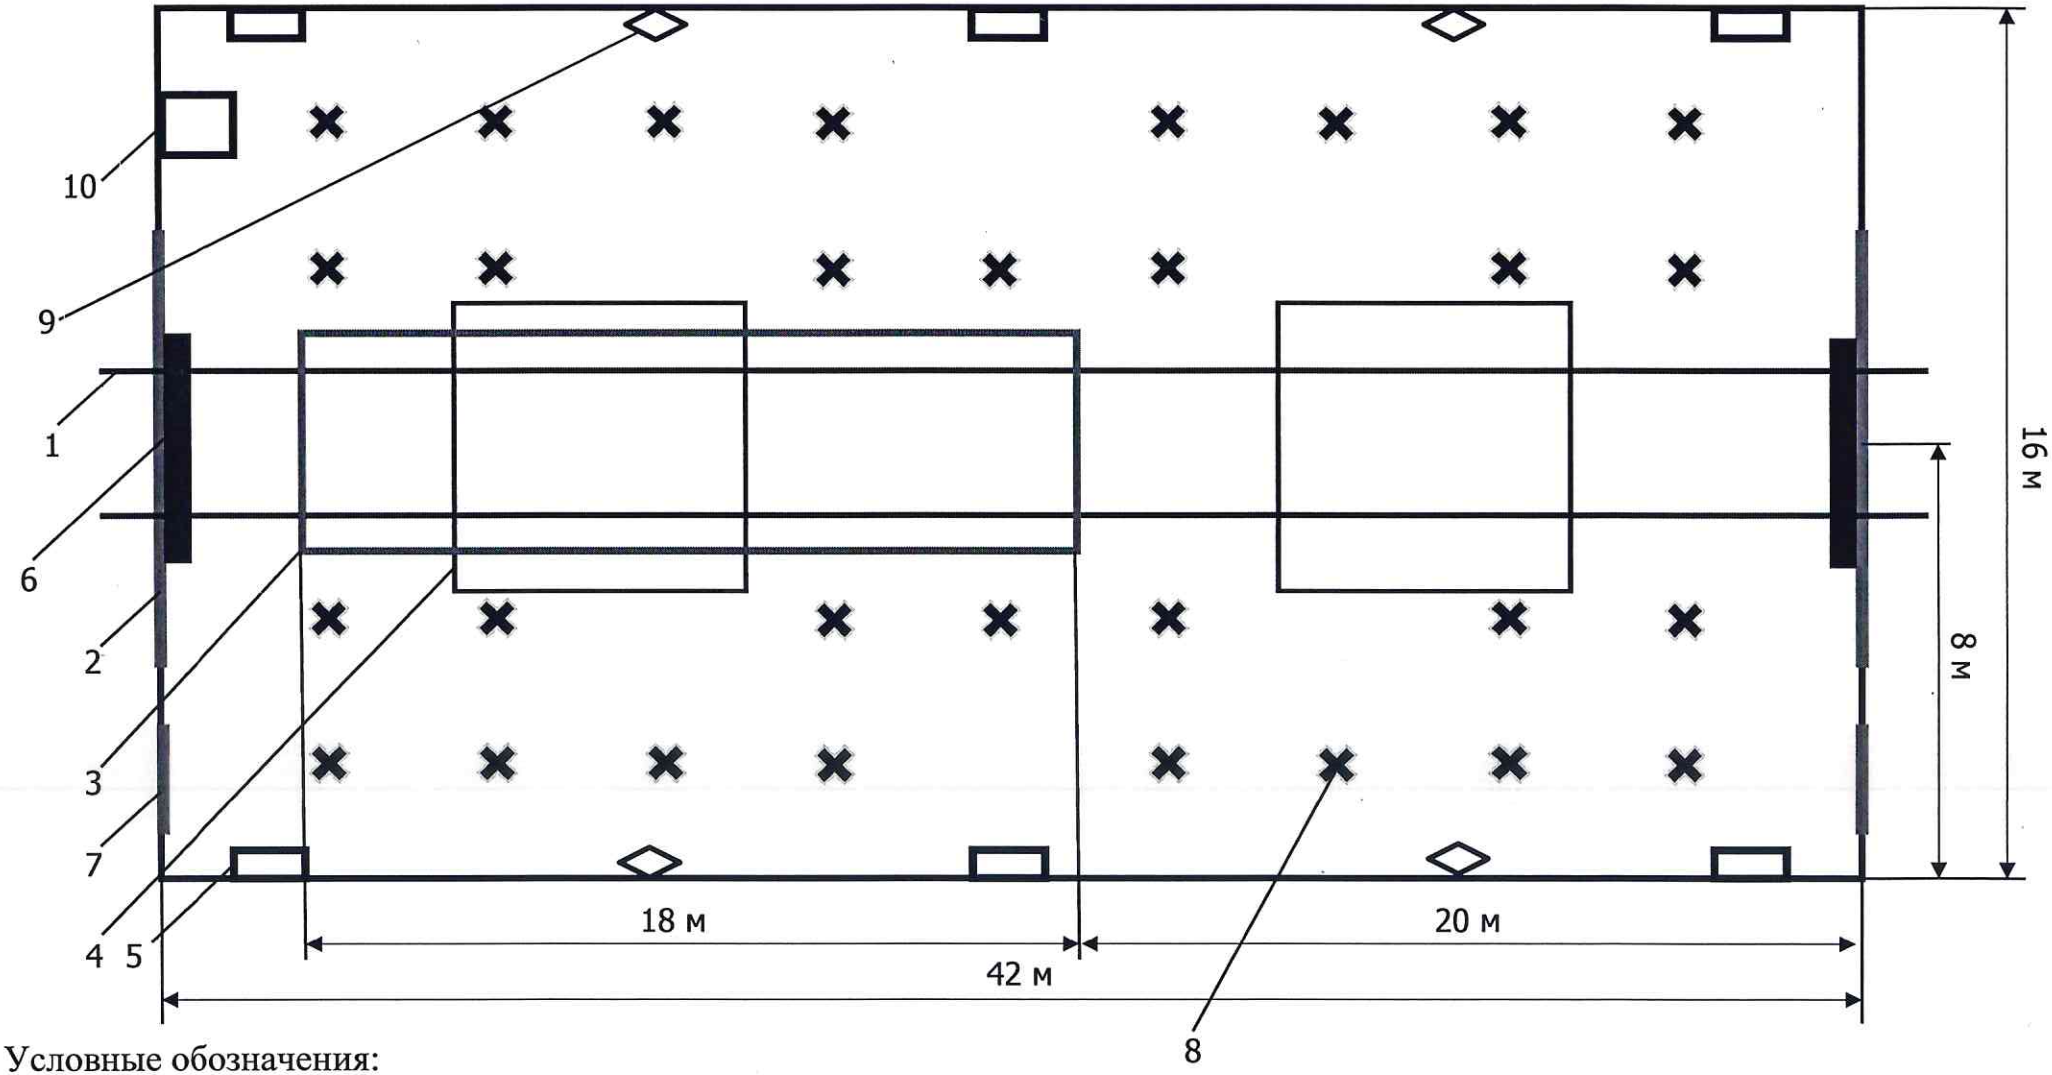
подпись А.И. Хусаинов
инициалы, фамилия

Начальник службы по проектированию и капитальному строительству АО «Красноярскккрайуголь»

подпись Е.Л. Пуд
инициалы, фамилия


6,5м
10м
2м
5м
1м


16м
42м



Условные обозначения:

1 – Ж/д путь;

2 – Ворота – 2 шт.;

3 – Смотровая канава;

4 – Вентиляция – 2 шт.;

5 – Система отопления – электрическая (тепловые пушки закрытого горения 25 кВт

6 – Тепловая завеса на воротах – 2 шт.;

7 – Входная дверь – 2 шт.;

8 – Освещение светодиодное – 30 шт.;

9 – Силовые розетки;

10 – Щит электрораспределительный.
